N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéces	Noms ressources
1			**Axe fonctionnel: Efficacité et Efficience**	**274 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 12-08-31**		
2			**Révision - mode de fonctionnement**	**229 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 12-06-29**		
3			convertion du document pdf - Word	4 jours	Mar 11-08-16	Ven 11-08-19		Coordonnateur
4			adapter le document aux réalités 2011	6 jours	Mar 11-11-22	Mar 11-11-29		Consultante;Coordonnateur
5			page sommaire des Scomités - membriété et mandat, attentes	1 jour	Jeu 11-08-25	Jeu 11-08-25		Coordonnateur
6			validation avec directeur et ajustement	1 jour	Mar 11-08-30	Mar 11-08-30	5	Coordonnateur;Directeur
7			ajustement, difusion et utilisation	3 jours	Mer 11-11-30	Ven 11-12-02	4	Coordonnateur
8			**Calendrier de rencontres**	**24 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 11-09-16**		
9			élaboration du calendrier, choix de dates	2 jours	Lun 11-08-29	Mar 11-08-30		Coordonnateur;Directeur
10			RSVP rencontre du 9 sept	2 jours	Jeu 11-08-18	Ven 11-08-19		Coordonnateur
11			présentation de l'ébauche au Leaders	1 jour	Ven 11-09-09	Ven 11-09-09	9	Coordonnateur
12			diffusion du calendrier	5 jours	Lun 11-09-12	Ven 11-09-16	11	Coordonnateur
13			**Dynamique des rôles**	**24 jours**	**Mar 11-09-27**	**Ven 11-10-28**		
14			définition des rôles et mandats	3 jours	Mar 11-09-27	Jeu 11-09-29		Consultante;Coordonnateur
15			dynamique et relation entre les rôles	1 jour	Ven 11-09-30	Ven 11-09-30	14	Consultante;Coordonnateur
16			présentation aux Leaders	1 jour	Ven 11-10-07	Ven 11-10-07	15	Coordonnateur
17			insertion/diffusion- fonctionnement	1 jour	Lun 11-10-10	Lun 11-10-10	16	Coordonnateur
18			**Cheminement critique, monitorage,budget, plan**	**59 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 11-11-04**		
19			montage du plan de projet	4 jours	Mar 11-08-16	Ven 11-08-19		Coordonnateur
20			équilibrer le calendrier/plan	3 jours	Lun 11-08-22	Mer 11-08-24		Coordonnateur
21			point de contrôle - monitorage	3 jours	Jeu 11-09-29	Lun 11-10-03		Consultante;Coordonnateur
22			élaborer un cadre d'évalulation et de monitorage continu	3 jours	Mar 11-10-04	Jeu 11-10-06		Consultante;Coordonnateur
23			élaborer un plan de mise en oeuvre du plan de monitorage	2 jours	Ven 11-10-07	Lun 11-10-10	22	Consultante;Coordonnateur
24			budgétisation - amalgamation-équilibrage	2 jours	Mer 11-08-24	Jeu 11-08-25	19	Coordonnateur
25			intégration au plan GIARE 2011-2012	2 jours	Ven 11-08-26	Lun 11-08-29	24	Coordonnateur
26			présentation du plan au DG du CSPNE	1 jour	Mar 11-08-30	Mar 11-08-30		Coordonnateur;Directeur
27			rencontre PNC	1 jour	Jeu 11-09-01	Jeu 11-09-01	25	Coordonnateur
28			envoi et présentation du plan aux Leaders	5 jours	Lun 11-09-05	Ven 11-09-09	25	Coordonnateur
29			signature des 12 DJ	9 jours	Lun 11-09-12	Jeu 11-09-22	28	D.G.;Directeur;Leader GIARE
30			envoi du plan au MÉO	1 jour	Ven 11-09-23	Ven 11-09-23	29	Coordonnateur;Directeur
31			**Axe stratégique: Communication et Collaboration**	**274 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 12-08-31**		
32			**Structure de communication continue**	**94 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 11-12-23**		

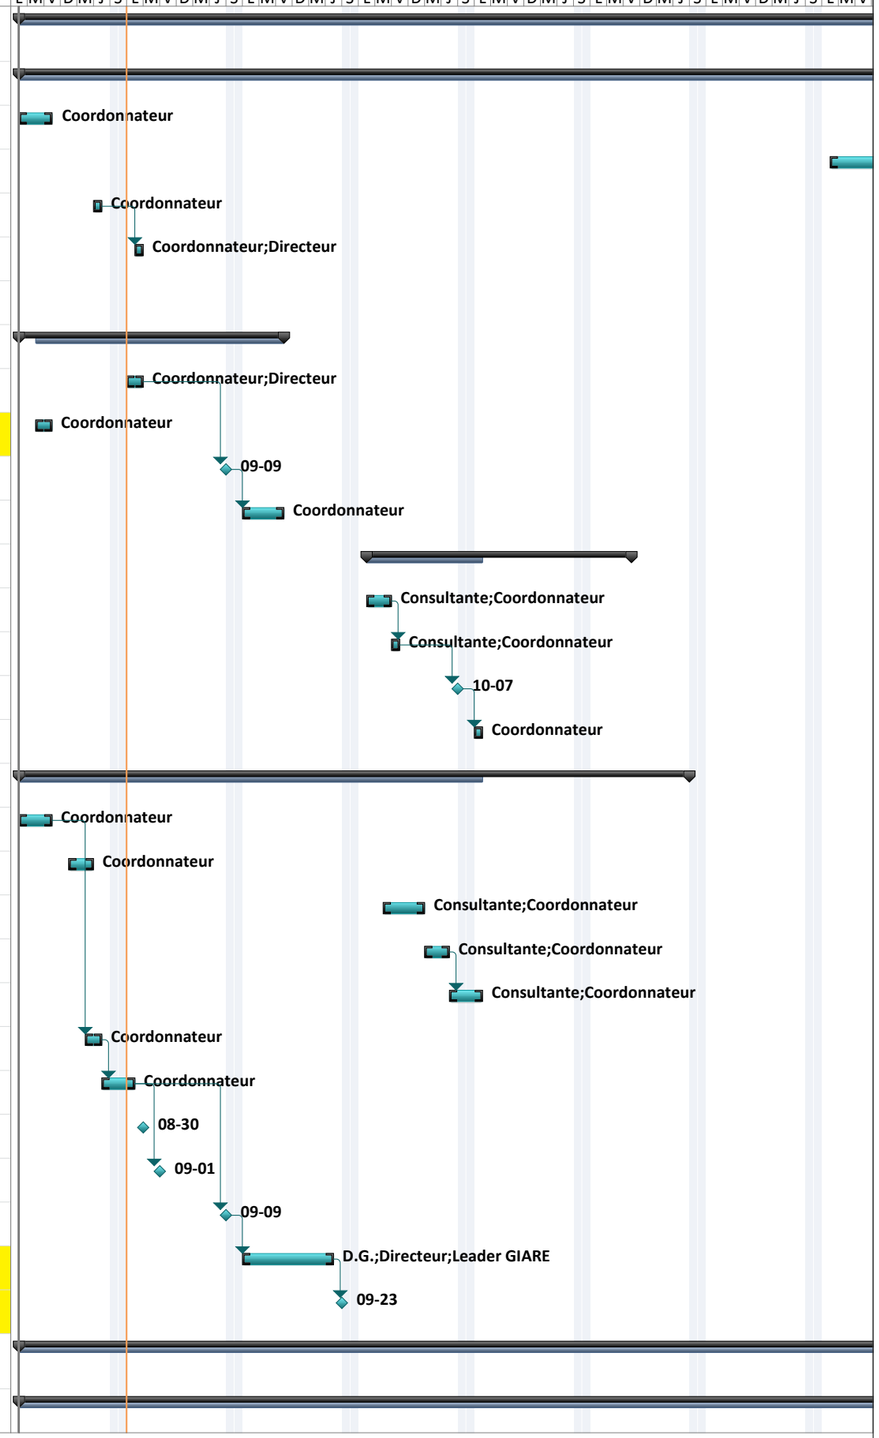
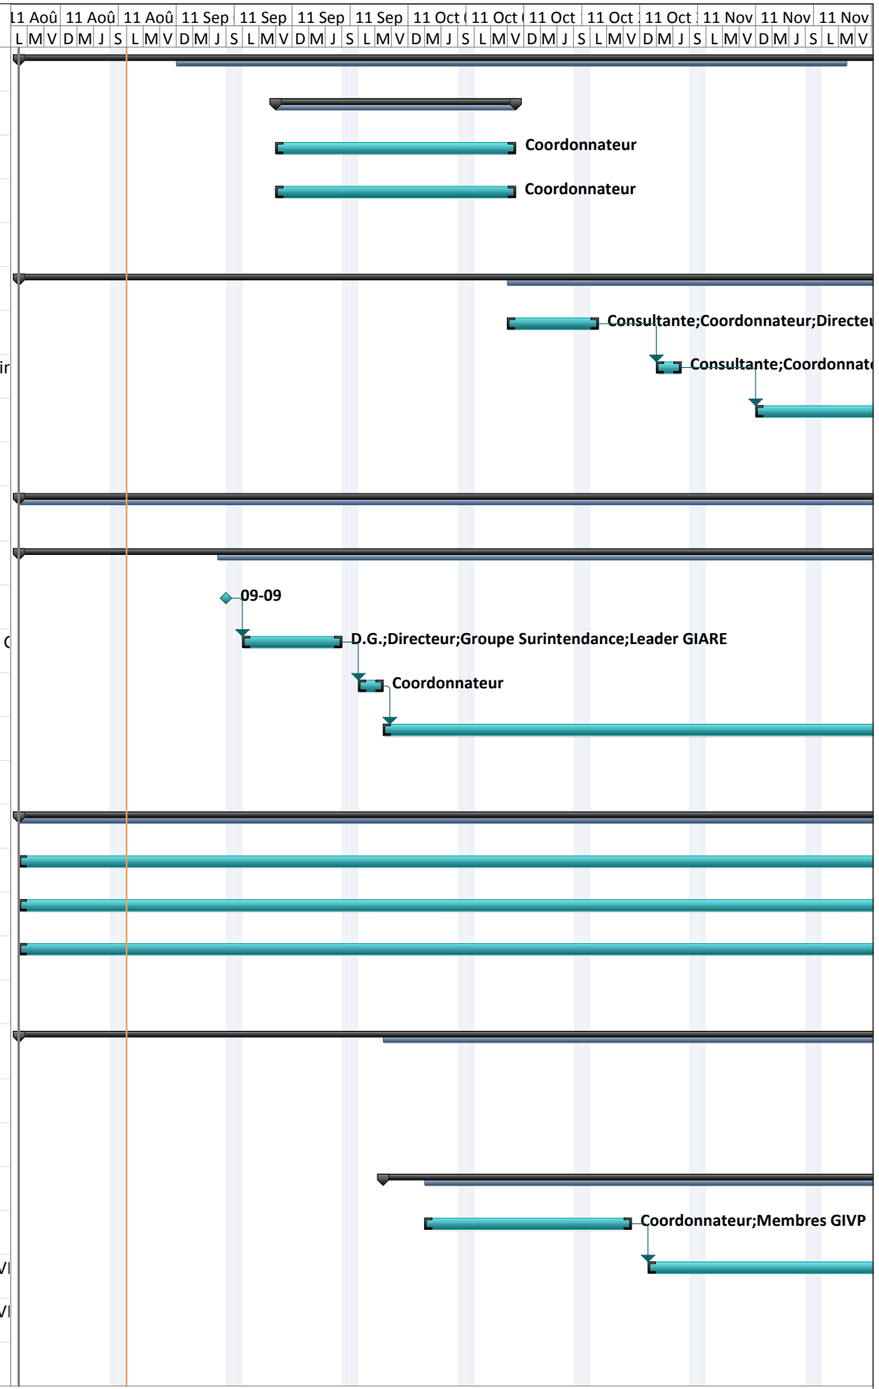
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéces	Noms ressources
33		**Nouveau site Web**	**94 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 11-12-23**		
39		**Lien avec la communauté de recherche**	**21 jours**	**Ven 11-09-16**	**Ven 11-10-14**		
40		3 Universités franco-ontariennes	21 jours	Ven 11-09-16	Ven 11-10-14		Coordonnateur
41		Autres Universités, chercheurs	21 jours	Ven 11-09-16	Ven 11-10-14		Coordonnateur
42		**Programme de sensibilisation**	**60 jours**	**Lun 12-01-09**	**Ven 12-03-30**		
49		**Plan de communication**	**94 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 11-12-23**		
50		input du directeur - consultante	7 jours	Ven 11-10-14	Lun 11-10-24		Consultante;Coordonnateur;Directeur
51		acteurs clés - implication, prise en charge, communication	3 jours	Mar 11-11-01	Jeu 11-11-03	50	Consultante;Coordonnateur;D.G.;Groupe Surir
52		élaboration du plan	16 jours	Dim 11-11-13	Ven 11-12-02	51	Consultante;Coordonnateur
53		présentation du plan	3 jours	Lun 11-12-05	Mer 11-12-07	52	Coordonnateur;Directeur
54		**Axe stratégique: Bâtir la capacité**	**274 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 12-08-31**		
55		**Recensement de rapports (conjoint avec SC Gestion et Analyse)**	**94 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 11-12-23**		
56		validation échéancier avec Leaders	1 jour	Ven 11-09-09	Ven 11-09-09		Coordonnateur;Directeur;Leader GIARE
57		validation structure et catégories avec CODELF-surintendants	10 jours	Lun 11-09-12	Ven 11-09-23	56	D.G.;Directeur;Groupe Surintendance;Leader G
58		ajustement de la structure des catégories	3 jours	Lun 11-09-26	Mer 11-09-28	57	Coordonnateur
59		recueil et collecte - 12 csd	45 jours	Jeu 11-09-29	Mer 11-11-30	58	Coordonnateur;Leader GIARE
60		consolidation du recensement	12 jours	Jeu 11-12-01	Ven 11-12-16	59	Coordonnateur;S-Comité Bâtir
61		**Projets Mobilisation Recherche - RECRAE (3 sous-projets)**	**229 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 12-06-29**		
62		Écart garçons-filles	164 jours	Mar 11-08-16	Ven 12-03-30		
63		Numératie 7-9	229 jours	Mar 11-08-16	Ven 12-06-29		
64		Communication orale petite enfance	229 jours	Mar 11-08-16	Ven 12-06-29		
65		**Prototype de cadre de données**	**125 jours**	**Lun 12-01-09**	**Ven 12-06-29**		
75		**Axe stratégique: Gestion et Analyse**	**274 jours**	**Mar 11-08-16**	**Ven 12-08-31**		
76		**Inventaire des rapports utilisés selon un gabarit standard**	**104 jours**	**Lun 12-01-09**	**Jeu 12-05-31**		
81		**Structure d'entreposage - Site Web GIARE**	**104 jours**	**Lun 12-01-09**	**Jeu 12-05-31**		
86		**GIVP - participation,collaboration et formation - transition**	**176 jours**	**Jeu 11-09-29**	**Jeu 12-05-31**		
87		transition - Groupe de travail vers réseau de collaboration	19 jours	Mar 11-10-04	Ven 11-10-28		Coordonnateur;Membres GIVP
88		élaboration du mécanisme de collaboration - 72 csd	29 jours	Lun 11-10-31	Jeu 11-12-08	87	Coordonnateur;Membres GIVP;volontaire GIVI
89		évolution de la trousse GIVP	49 jours	Lun 12-01-09	Jeu 12-03-15		Coordonnateur;Membres GIVP;volontaire GIVI
90		diffusion de la formation	40 jours	Lun 12-04-02	Ven 12-05-25		Coordonnateur;Leader GIARE;volontaire TI
